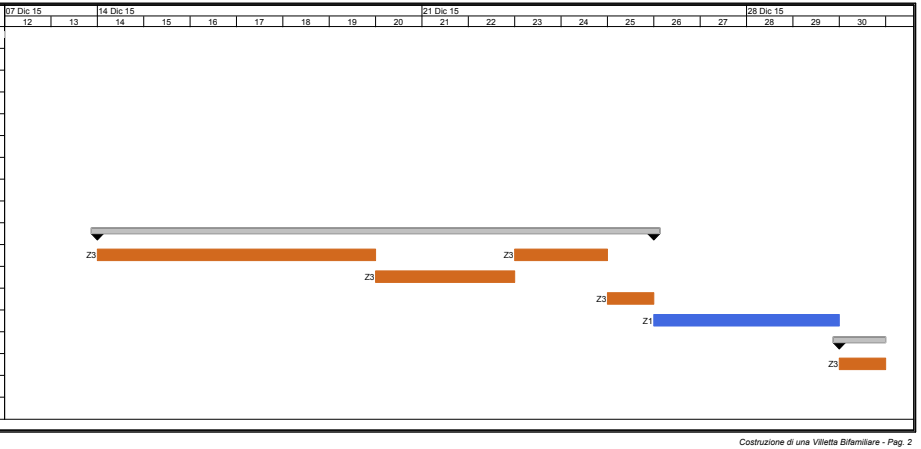Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	15 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	4 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Montaggio e smontaggio della gru a torre	4 g
Scavo di sbancamento	15 g
Strutture in fondazione in c.a.	12 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	8 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	3 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g
Strutture in elevazione in c.a.	103 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	24 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi	21 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	6 g
